



**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“
2010 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITA
(2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA)**

Vilnius, 2011

Įstaigos veikla

Įstaigos veiklos tikslai yra:

1. tenkinti viešuosius interesus, efektyviai ir tinkamai panaudojant savininko padarytus įnašus į Įstaigos kapitalą, bei iš Įstaigos veiklos gautą pelną, sukurti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus institucijoms ir sudaryti prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškųjų vietovių bendruomenių nariams;
2. teikti, rinkti, analizuoti ir skelbti socialinę ekonominę informaciją, organizuoti mokymus, leisti informacinius, metodinius ir pan. leidinius;
3. rengti projektus, teikti paraiškas jų įgyvendinimo finansavimui gauti ir juos įgyvendinti;
4. organizuoti informacinių technologijų tinklo eksploataciją, paslaugų panaudojant sukurta šviesolaidinių kabelinių linijų tinklų infrastruktūrą, teikimą.

Reikšmingi 2010 m. įvykiai

2010 m. vasario 17 d. raštu Nr. 14-4 Susisiekimo ministerija pritarė VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Įstaiga) 2010-2012 metų strateginiam veiklos planui.

Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius per ataskaitinį laikotarpį atliko projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ (toliau – RAIN-2 projektas) vidaus auditą ir 2010 m. kovo 5 d. raštu Nr. 10-2-12 pateikė VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ audito ataskaitą ir rekomendacijas.

Viešojo įstaiga „Plačiajuostis internetas“ su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka 2010 m. kovo 19 d. pasirašė Paslaugų pirkimo sutartį Nr. TR-87/S-138 dėl projekto infrastruktūrinės dalies viešųjų pirkimų techninės specifikacijos parengimo paslaugų ir infrastruktūrinės dalies viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo paslaugų teikimo.

2010 m. kovo 24 d. vyko projekto RAIN-2 priežiūros komiteto posėdis, kurio metu buvo nutarta pasiūlyti Susisiekimo ministerijai ir (arba) Įstaigai kreiptis į savivaldybių merus, kad šie pareikštų savo poziciją dėl šalia RAIN-2 trasų esančių savivaldybių objektų prijungimo prie RAIN tinklo; rekomenduoti, kad projekto vykdytoja Susisiekimo ministerija pagal gautus vietos savivaldos ir valstybės institucijų bei operatorių prašymus kreiptųsi į VŠĮ Centrinę projektų valdymo agentūrą (toliau – CPVA), prašydama suderinti papildomų šių institucijų objektų, esančių prie klojamų RAIN-2 šviesolaidinių kabelinių linijų, prijungimą prie tinklo nekeičiant RAIN-2 finansavimo apimčių. Įgyvendindama RAIN-2 priežiūros komiteto sprendimą, Susisiekimo ministerija 2010 m. kovo 30 d. raštu Nr. 2-1452(17) ir Įstaiga 2010 m. kovo 31 d. raštu Nr. R-10-195 kreipėsi į CPVA, prašydamos

suderinti papildomų vietos savivaldos objektų prijungimą prie RAIN tinklo. 2010 m. balandžio 13 d. raštu Nr. 2010/2-3672 patvirtino, kad CPVA neprieštarauja planuojamų papildomų prisijungimo taškų įrengimui (ne pačių objektų pajungimui prie RAIN-2 tinklo) siekiant, kad būtų sudarytos galimybės prie RAIN-2 tinklo infrastruktūros prijungti kuo daugiau vietos savivaldos objektų, nekeičiant RAIN-2 projekto biudžeto.

2010 m. kovo 24 d. vyko projekto RAIN koordinacinės tarybos posėdis, kurio metu buvo pritarta pasiūlytiems RAIN tinklo panaudojimo efektyvumo rodikliams.

2010 m. kovo 31 d. Įstaiga ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos sudarė susitarimą dėl požeminių šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo, priežiūros ir/ar išskėlimo iš valstybinės reikšmės kelių juostų. Šis susitarimas sudarė galimybes pasirašyti sutartis su kitomis valstybinius kelius valdančiomis valstybės įmonėmis dėl RAIN-2 projekto linijų klojimo kelių juostoje.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį įvykdė šių projekto RAIN-2 įgyvendinimui reikalingų pirkimų procedūras: RAIN-2 informacinių stendų pirkimas, RAIN-2 informacinių stendų įrengimas, RAIN-2 turto draudimo paslaugos, RAIN-2 informacinės ir padalomosios medžiagos gamyba, RAIN-2 informacinės medžiagos (lankstinukų, plakatų) platinimo paslaugos, RAIN-2 padalomosios informacinės medžiagos ir kalendorių platinimas paštu, RAIN-2 pristatymo parodose organizavimo paslaugos (RAIN-2 įgyvendinimo pristatymo seniūnų apdovanojimuose paslaugų organizavimas Televizijos bokšte, Vilniaus m.), RAIN-2 vaizdo filmų ir reklaminių klipų parengimas, Tinklo pasyvinių ir komutavimo elementų pirkimas.

2010 m. balandžio 1 d. su TEO LT, AB buvo pasirašyta nauja vietos ryšių kabelių kanaluose nuomos sutartis, pakeitusi iki tol galiojusią. Naująja sutartimi nustatytas įstatymų nustatyta tvarka reguliuojamas vietos RKK nuomos įkainis – 96 Lt/1 km bei taikomos 14 proc. nuolaidos.

2010 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 3-203 susisiekimo ministras patvirtino Susisiekimo ministerijos ir įstaigų prie Susisiekimo ministerijos 2010-2012 metų strateginius veiklos planus.

2010 m. balandžio 9 d. potvarkiu Nr. 4-26 Susisiekimo ministerijos kancleris patvirtino Projekto „Kaimišųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN“ plėtra, projekto kodas VP2-3.2-IVPK-01-V-01-001, procedūrų vadovą. Šiuo vadovu buvo išsamiai reglamentuoti Susisiekimo ministerijos ir viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“, kaip RAIN-2 projekto partnerių, tarpusavio procedūros įgyvendinant projektą.

2010 m. balandžio 22 d. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pateikė Susisiekimo ministerijai paaiškinimą dėl galimybės įtraukti į PVM atskaitą ir susigrąžinti iš biudžeto

sumokėtą pirkimo PVM. Šiame rašte Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos konstatavo, kad projekto RAIN-2 metu sukurta infrastruktūra bus naudojama viešosios įstaigos „Plaćiajuostis internetas“ PVM apmokestinamai ekonominei veiklai vykdyti.

2010 m. gegužės 7 d. raštu Nr. 2010/2-4619 CPVA patvirtino Susisiekimo ministerijai, kad viešoji įstaiga „Plaćiajuostis internetas“ RAIN-2 projektui vykdyti įsigytų prekių, paslaugų ir darbų pirkimo PVM įtrauktų į PVM atskaitą, kad PVM dengti, kol viešajai įstaigai „Plaćiajuostis internetas“ bus sugražintas PVM, būtų panaudotas RAIN-2 projekto avansas ir kad Valstybinei mokesčių inspekcijai patvirtinus, kad RAIN-2 projektui vykdyti įsigytų prekių, paslaugų ir darbų pirkimo PVM viešoji įstaiga „Plaćiajuostis internetas“ turi teisę įtraukti į PVM atskaitą, būtų keičiama RAIN-2 projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatos, reglamentuojančios PVM tinkamumą apmokėti ES struktūrinių fondų lėšomis ir RAIN-2 projekto biudžetą. Analogišką pritarimą 2010 m. gegužės 7 d. raštu Nr. 4(S)-589 Susisiekimo ministerijai pateikė ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

2010 m. balandžio 30 d. Kauno rajone, Čekiškės seniūnijoje, netoli Liučiūnų kaimo pradėti RAIN-2 projekto statybos darbai. Į projekto statybos darbų atidarymo šventę atvyko susisiekimo ministras, Kauno apskrities ir savivaldybės vadovai, RAIN-2 įgyvendinančių rangovų, žiniasklaidos atstovai ir kt. dalyviai džiaugėsi sėkminga ir sklandžia projekto įgyvendinimo pradžia. Susisiekimo ministrui simboliškai patiesus pirmuosius metrus šviesolaidinių kabelinių linijų, oficialiai paskelbta statybos darbų pradžia.

2010 m. gegužės 20 d. viešoji įstaiga „Plaćiajuostis internetas“ pasirašė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. IBC/2010-99 su UAB „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“. Pasirašiusi šią sutartį, viešoji įstaiga „Plaćiajuostis internetas“ baigė naujųjų viešosios įstaigos „Plaćiajuostis internetas“ biuro patalpų pirkimą.

2010 m. gegužės 31 d. raštu Nr. R-10-327 viešoji įstaiga „Plaćiajuostis internetas“ pateikė Susisiekimo ministerijai RAIN-2 projekto biudžeto kainų pagrįstumą, biudžetą detalizuojant ir lyginant su panašaus pobūdžio projekto RAIN faktinėmis kainomis, tuo galutinai įgyvendindama Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus vidaus audito ataskaitoje Nr. VA/10-2 pateiktas rekomendacijas.

2010 m. birželio 15 d. raštu Nr. (21.26)-89-672 Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė pranešimą apie atliktą mokestinį tyrimą. Šiame pranešime, be kitų išvadų, buvo konstatuota, kad projekto RAIN-2 metu sukurta infrastruktūra bus naudojama viešosios įstaigos „Plaćiajuostis internetas“ PVM apmokestinamai ekonominei veiklai vykdyti.

2010 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. (2.5)-A4-2623 Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino, kad RAIN-2 veiklos į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priede numatytą veiklų sąrašą nepatenka ir šio įstatymo nuostatos nėra taikomos.

Įvertindama personalo pokyčius, viešoji įstaiga „Plaćiajuostis internetas“ 2010 m. liepos 19 d. raštu R-10-435 kreipėsi į Susisiekimo ministeriją, prašydama paskirti naują atstovą į Prekių, paslaugų ir darbų, reikalingų projektui „Kaimiškujų vietovių informacinių technologijų plaćiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ įgyvendinti, viešųjų pirkimų komisiją (toliau – RAIN-2 pirkimų komisija). Taip pat šiuo raštu viešoji įstaiga „Plaćiajuostis internetas“ pateikė ir 2009 m. vasario 27 d. Projekto „Kaimiškujų vietovių informacinių technologijų plaćiajuosčio ryšio tinklo RAIN plėtra“ įgyvendinimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. SM-PI Nr. 1F-22/S-18 pakeitimo projektą.

2010 m. liepos 19 d. raštu Nr. 2-3665(17-1) Susisiekimo ministerija informavo į RAIN-2 pirkimų komisiją deleguojanti Susisiekimo ministerijos Informacinių ir ryšių technologijų departamento direktorių Gytį Liaugminą.

2010 m. liepos 20 įsakymu Nr. 3-455 susisiekimo ministras Susisiekimo ministerijos Informacinių ir ryšių technologijų departamento direktorių Gytį Liaugminą paskiria RAIN-2 projekto vadovu.

2010 m. liepos 22 d. raštu Nr. 2010/2-7775 CPVA (toliau – CPVA) iš dalies pritarė RAIN-2 projekto pirkimų plano pakeitimams, susijusiems su projekto viešinimo priemonių pirkimų apjungimu.

2010 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. 2-3985(17-1) Susisiekimo ministerija pateikė CPVA atnaujintą RAIN-2 projekto paraišką ir siūlomą finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimą. Atlikus RAIN-2 projekto galimybių studijos perskaičiavimus, paaiškėjo, kad kinta projekto pareiškėjos įnašo dydis, todėl buvo reikalinga atlikti pakeitimus.

2010 m. rugpjūčio 17 d. raštu Nr. 2-4201 Susisiekimo ministerija kreipėsi į Informacinės visuomenės plėtos komitetą prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK), prašydama padidinti galimą maksimalų projekto avansą nuo 2 mln. Lt iki 5 mln. Lt. Avanso didinimas reikalingas siekiant, kad nesutrikėtų atsiskaitymas su projektui įgyvendinti reikalingų pirkimo sutarčių tiekėjais, iš avanso lėšų dengiant projekto PVM, kol PVM bus sugrąžintas iš valstybės biudžeto. IVPK direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. T-216 pakeičiamas Projekto, vykdomo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2 3.2 IVPK 01 „Plaćiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“, finansavimo sąlygų aprašas, jame numatant, kad avanso projektui dydis negali viršyti 5 mln. Lt.

2010 m. rugsėjo 16 d. Susisiekimo ministerija, IVPK ir CPVA pasirašė RAIN-2 projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimą Nr. 1, kuriuo buvo pakeistas maksimalus projekto finansavimo dydis į 173 073221,65 Lt, avanso suma padidinta iki 5 mln. Lt, pareiškėjo įnašas pakeistas į 816 365,19 Lt.

Susisiekimo ministras 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 3-587 naujuoju Projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plėtimasis tinklas RAIN“ koordinacinės tarybos pirmininku paskiria Susisiekimo ministerijos Informacinių ir ryšių technologijų departamento direktorių Gytį Liaugminą ir įtraukia naują narį – viešosios įstaigos „Plėtimasis internetas“ technologijų ir plėtros vadovą Roką Jucį.

Per 2010 m. buvo sudaryta 60 sutarčių su valstybinės reikšmės kelias valdančiomis valstybės įmonėmis. Šiomis sutartimis buvo sudaryta galimybė RAIN-2 tinklus tiesti valstybinės reikšmės kelių juostoje.

2010 m. liepos 14 d. bankrutuojančios UAB „Telesta“ administratorius UAB „Avere“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. sprendimo, kuriuo teismas atmetė BUAB „Telesta“ ieškinį, kuriuo BUAB „Telesta“ iš atsakovės viešosios įstaigos „Plėtimasis internetas“ reikalavo priteisti 292 033,48 Lt. 2010 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos apeliaciniam teismui viešoji įstaiga „Plėtimasis internetas“ pateikė atsiliepinimą į apeliacinį skundą.

2010 m. Finansų ministerija persiuntė Europos Komisijos papildomus klausimus dėl RAIN-2 projekto. Atsakymai į šiuos klausimus buvo parengti ir perduoti Finansų ministerijai.

2010 m. liepos 14 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-442 buvo pakeisti viešosios įstaigos „Plėtimasis internetas“ įstatai ir buveinė, nustatant, kad naujoji buveinė yra adresu Šeimyniškių g. 1A, Vilnius. Naujieji įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2010 m. liepos 30 d.

Susisiekimo ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“, 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3-446 patvirtino Viešosios įstaigos „Plėtimasis internetas“ vadovo ir vyriausiojo buhalterio darbo apmokėjimo tvarkos aprašą ir priskyrė viešąją įstaigą II kategorijai. Viešosios įstaigos „Plėtimasis internetas“ vadovo ir vyriausiojo buhalterio darbo apmokėjimo tvarkos apraše nustatyta, kad Įstaigos vadovo ir vyriausiojo buhalterio mėnesinės algos kintamąją dalis (50 proc. pastoviosios dalies) priklauso nuo Įstaigos rezultatų pagal šiuos rodiklius: su ryšio operatoriais sudarytų sutarčių skaičių; vidutinį paslaugų pateikiamumą; naudojamų ryšio linijų ilgį (šie rodikliai buvo nustatyti Įstaigos 2009-2011 metų strateginiame veiklos

plane). Atkreiptinas dėmesys, kad tvirtinant viešosios įstaigos „Plaćiajuostis internetas“ 2010-2012 metų strateginį veiklos planą rodiklis „su ryšio operatoriais sudarytų sutarčių skaičius“ (2009-2011 metų strateginiame veiklos plane planuojama rodiklio reikšmė 2010 metams buvo 25) buvo pakeistas į rodiklį „suteiktų duomenų perdavimo paslaugų skaičius“, kadangi pastarasis rodiklis geriau perteikia Įstaigos strateginį tikslą – sudaryti vartotojams galimybes naudotis plaćiajuosćiu ryšiu.

2010 m. rugsėjo 14-17 d. viešosios įstaigos „Plaćiajuostis internetas“ atstovai dalyvavo Susisieikimo ministerijos kartu su Jungtinėmis Tautomis organizuoto penktojo Interneto valdymo forumo renginiuose.

Lietuvos Respublikos Seimas 2010 m. liepos 2 d. priėmė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23¹ straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 28¹ straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymą (Žin., 2010, Nr. 84-4401), kuriuo buvo iš esmės pakeistos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) nuostatos, reglamentuojančios statybų procesą. Minėtuoju įstatymu patvirtinti Statybos įstatymo pakeitimai įsigaliojo 2010 m. spalio 1 d. Būtent šie pakeitimai yra iš esmės susiję su RAIN-2 projekto įgyvendinimo sutartimis dėl ŠKL tiesimo ir techninės pagalbos. Tuo metu, kai buvo vykdomi RAIN-2 projekto rangos darbų ir techninės pagalbos pirkimai, teisės normos reglamentavo, kad šviesolaidinių kabelinių linijų statybai buvo taikomos Statybos įstatymo ir jį įgyvendinančių poįstatyminių teisės norminių aktų nuostatos. Iki 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusiu Statybos įstatymo pakeitimų visi telekomunikacijų linijų, įskaitant šviesolaidinių kabelių linijas, statybos darbai buvo vykdomi vadovaujantis Statybos įstatymo nustatyta tvarka, kadangi pagal tuo metu galiojusį statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ telekomunikacijų linijos buvo priskirtos II grupės nesudėtingiems statiniams. Nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojus Statybos įstatymo pakeitimams, Statybos įstatyme yra aiškiai nustatyta, kad Statybos įstatymas taikomas tik tų daiktų projektavimui, statybai, statybos užbaigimui, naudojimui ir priežiūrai bei nugriovimui, kurie yra laikytini statiniais. Pagal šiame įstatyme naujai išdėstyta sąvoką „statiniai“ šviesolaidinės kabelinės linijos nėra laikytinos statiniais, todėl Statybos įstatymas ir jį lydintieji teisės aktai linijų įrengimui nėra taikomi. Iš esmės nuo 2010 m. spalio 1 d. šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo procesas tapo nereglamentuotas.

UAB „Optimalus ryšys“, teikianti RAIN-2 projekto techninės pagalbos paslaugas, nuo 2010 m. spalio 12 d. reorganizuota prijungimo būdu prie UAB „OR Consulting“. Šis reorganizavimas neturėjo įtakos RAIN-2 techninės pagalbos sutarties vykdymui.

2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-944 žemės ūkio ministras įgaliojo viešąją įstaigą „Plaćiajuostis internetas“ organizuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administruojamos Lietuvos kaimo plėtos 2007-2013 m. programos 3 krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ Subpriemonės „Plaćiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ galimybių studijos finansinės ir ekonominės dalių parengimo paslaugų pirkimą.

2010 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 3-758 susisiekimo ministras patvirtino viešosios įstaigos „Plaćiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifus, kurie buvo suderinti su Ryšių reguliavimo tarnyba.

Per 2010 m. įvyko 6 viešosios įstaigos „Plaćiajuostis internetas“ tarybos posėdžiai.

Per 2010 m. įvyko 2 Projekto „Kaimiškujų vietovių informacinių technologijų plaćiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ priežiūros komiteto posėdžiai.

Per 2010 m. įvyko 2 RAIN projekto koordinacinės tarybos posėdžiai.

Įstaigos strateginio veiklos plano vykdymas

Įstaiga, vykdydama veiklą, sėkmingai pasiekė visus įstaigos strateginiame veiklos plane 2010 metams numatytus tikslus:

Tikslas	Uždavinys	Vertinimo kriterijus	2010 m. planas	Įvykdymas
Suteikti prieigą prie plaćiajuosčio ryšio tinklo viešojo sektoriaus institucijoms visoje Lietuvos teritorijoje bei sudaryti galimybę prie šio tinklo prisijungti vartotojams (RAIN projektas)	Teikti didmenines duomenų perdavimo ir ryšio paslaugas	Suteiktų duomenų perdavimo paslaugų skaičius (augančiais sk.)	860	861
	Teikti didmenines ryšio paslaugas šviesolaidinėmis skaidulomis	Suteiktų ryšio paslaugų šviesolaidinėmis skaidulomis ilgis kilometrais (augančiais sk.)	3500	3540
	Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę	Vidutinis paslaugų pateikiamumas proc.	98	99,5
Išspręsti skaitmeninės atskirties tarp miesto ir kaimiškujų vietovių problemą bei iš esmės paspartinti žinių ir informacinės visuomenės vystymąsi Lietuvoje (projektas „Kaimiškujų vietovių	Parinkti patalpas RAIN-2 projekto objektams įrengti	Nuvykus į atitinkamas gyvenvietes surinkti informaciją bei parinkti patalpas (proc.)	80	80
	Sukurti trūkstantį plaćiajuosčio ryšio infrastruktūrą	Kontroliuoti vykdomus infrastruktūros projektavimo, statybos ir diegimo darbus, derinti techninius sprendimus ir	5	36

informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“)		projektus (proc.)		
	Įrengti plačiajuosčio tinklo objektus.	Kontroliuoti vykdomus tinklo objektų įrengimo darbus, funkcionalumo užtikrinimą, derinti techninius sprendimus ir projektus (proc.)	5	5

Projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ įgyvendinimas

Projekto RAIN-2 įgyvendinimas vykdomas pagal numatytą grafiką.

Nr.	Projekto veiklos pavadinimas	Pradėta iki projekto administravimo ir finansavimo sutarties pasirašymo dienos	Projekto mėnuo, kai pradėdama projekto veikla	Projekto mėnuo, kai baigiama vykdyti projekto veikla	Projekto veiklos vykdymo mėnuo																																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1.	1.1.1 Šviesolaidinių kabelinių linijų projektavimas ir statyba	Ne	1	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.	1.2.1 Suprojektuoti ir įrengti seniūnijų lygmens tinklo infrastruktūrą bei prisijungimo taškus	Ne	3	40			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	1.2.2 Suprojektuoti ir įrengti savivaldybių lygmens tinklo infrastruktūrą	Ne	9	40										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	1.3.1 Suprojektuoti ir įrengti tinklo ir paslaugų valdymo sistemas	Ne	12	40										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Šviesolaidinių kabelinių linijų statybos ir eksploatavimo darbai

Per ataskaitinį laikotarpį eksploatavimo paslaugų teikėjui (UAB Inovacinė firma „Savel“) pateikti užsakymai ir jo vykdytos veiklos: šviesolaidinių kabelių nepažeidžiamumo užtikrinimas, techninių sąlygų išdavimas, skambučių ir valdymo centro veikla, dokumentacijos perėmimas ir priežiūra, pasyvinės ir aktyvinės tinklo dalies priežiūra linijoms, kuriomis yra teikiamos paslaugos. Taip pat pagal atskirus užsakymus vykdytos gedimų šalinimo ir kitos veiklos.


Patikrinti rangovų pateiktų subrangovų kvalifikacijos dokumentai ir leista šiems subrangovams vykdyti deklaruojamus darbus (projektų rengimo, melioracijos projektų rengimo).

Su statybos darbų rangovais derintos šviesolaidinių kabelinių linijų trasos, vykdyti projektų derinimo darbai. Taip pat su rangovais derintos ir patvirtintos projektų darbų programos ir nuolatinių darbų svarbiausių kiekių sąrašai.


Per ataskaitinį laikotarpį rangovai gavo ir pateikė statybos leidimus šviesolaidinių kabelinių linijų statybai 40 savivaldybių.

Rangovai vykdė šviesolaidinių kabelinių linijų ir įvadų statybos darbus. Vykdyta atliekamų darbų patikra vietose, tikrinta darbų kokybė.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2010 m. gruodžio 31 d.) iš visų numatytų 4809 km šviesolaidinių kabelinių linijų buvo suprojektuota 3090 km (64 proc.), gauti statybos leidimai 2836 km (59 proc.), vykdomi statybos darbai 2203 km (46 proc.) šviesolaidinių kabelinių linijų.

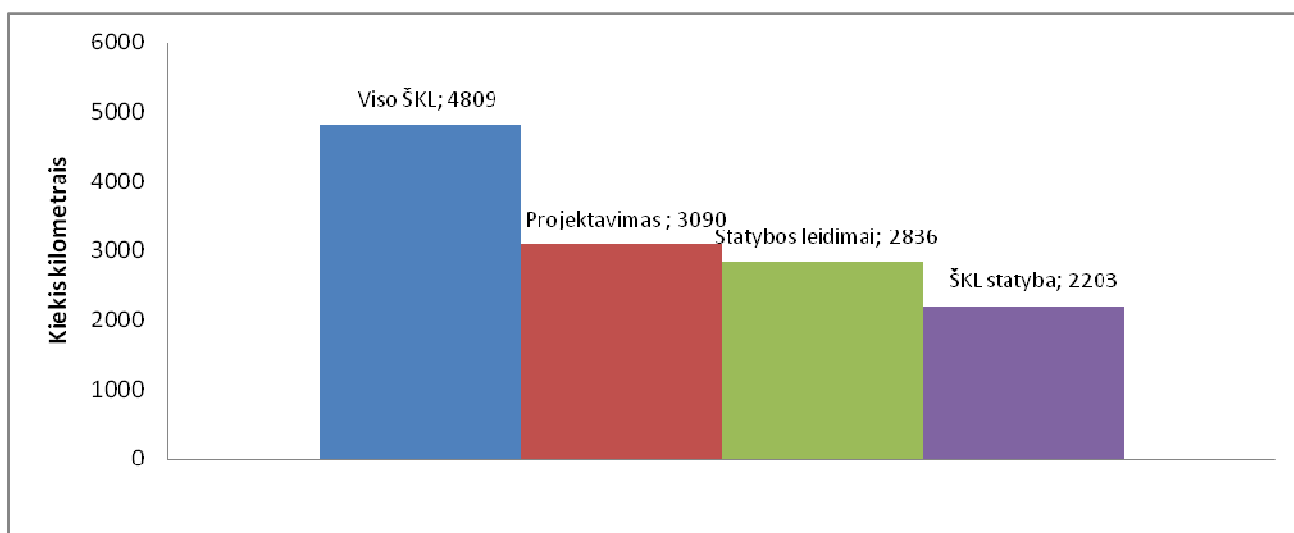



Sparčiausiai šviesolaidinių kabelinių linijų klojimo darbai per ataskaitinį laikotarpį buvo vykdomi Kauno ir Marijampolės apskrityse. Visuose regionuose šviesolaidinių kabelinių linijų statybos darbai vyko pagal numatytus grafikus.

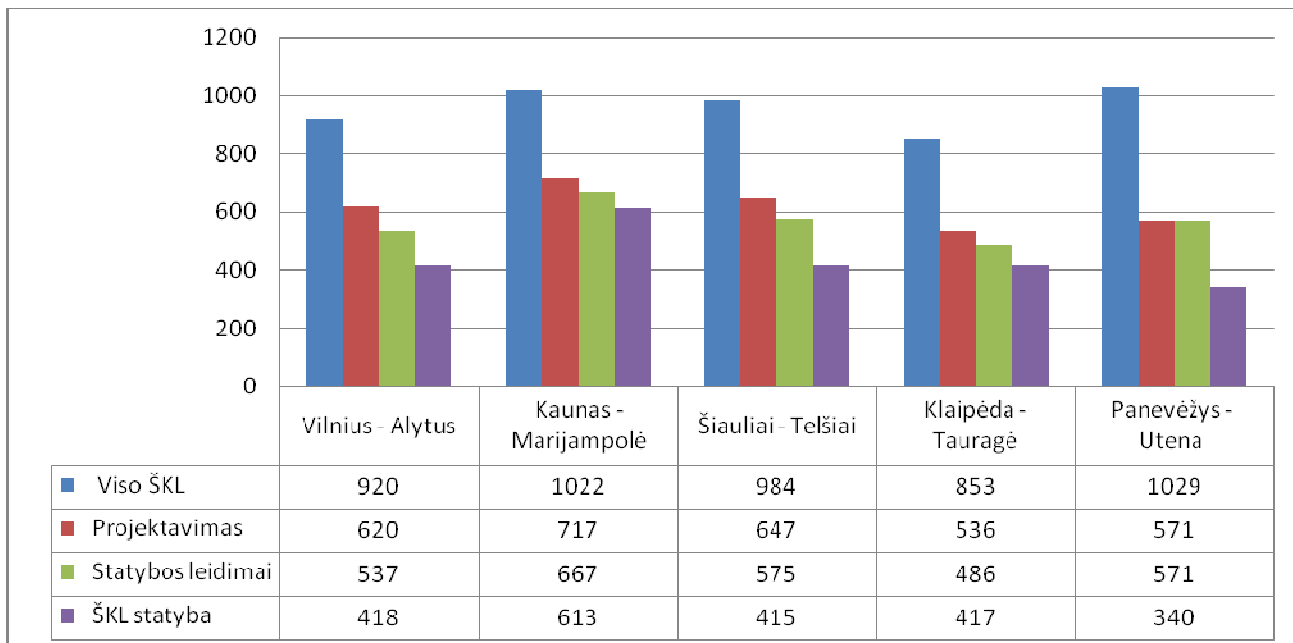

Pardavimai

Per 2010 m. VŠĮ „Plaçiajuostis internetas“ projekto „Kaimiškujų vietovių informacinių technologijų plaçiajuostis tinklas RAIN“ įgyvendinimo metu sukurtu ir projekto „Kaimiškujų vietovių informacinių technologijų plaçiajuosçio tinklo RAIN plėtra“ kuriamu tinklu suteikė ryšio operatoriams 266 naujas ryšio paslaugas. Iš jų 45 ryšio paslaugas šviesolaidinio kabelio skaidulomis (atstumas – 278,8 kilometro) ir 221 duomenų srauto perdavimo 100Mb/s sparta paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VŠĮ „Plaçiajuostis internetas“ ryšio operatoriams iš viso teikė 1375 ryšio paslaugas. Iš jų 514 ryšio paslaugas šviesolaidinio kabelio skaidulomis (atstumas – 3539,8 kilometro) ir 861 duomenų srauto perdavimo 100Mb/s sparta paslaugas.

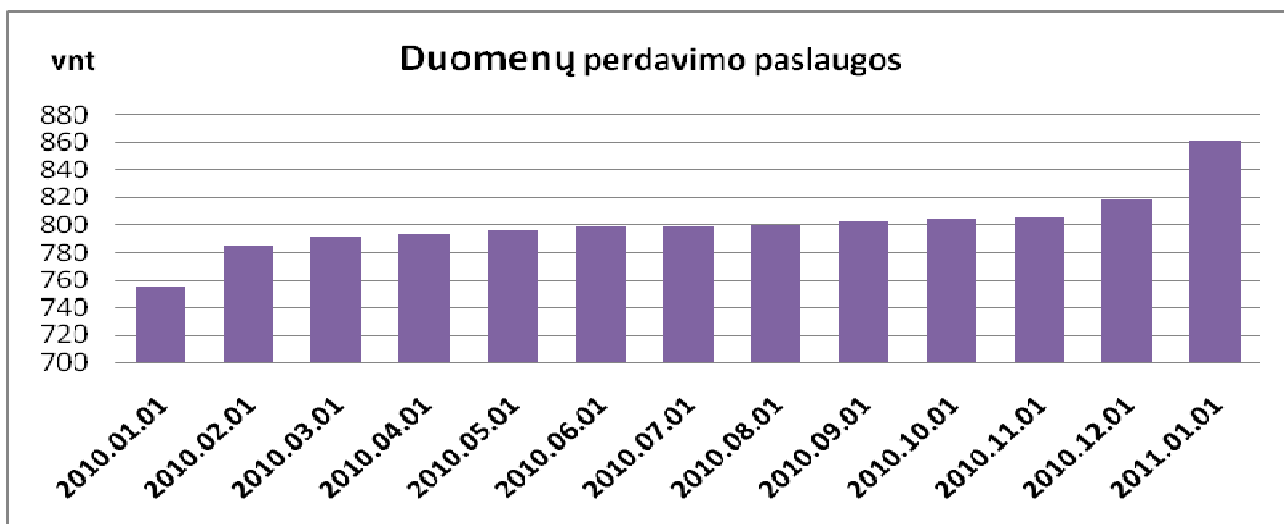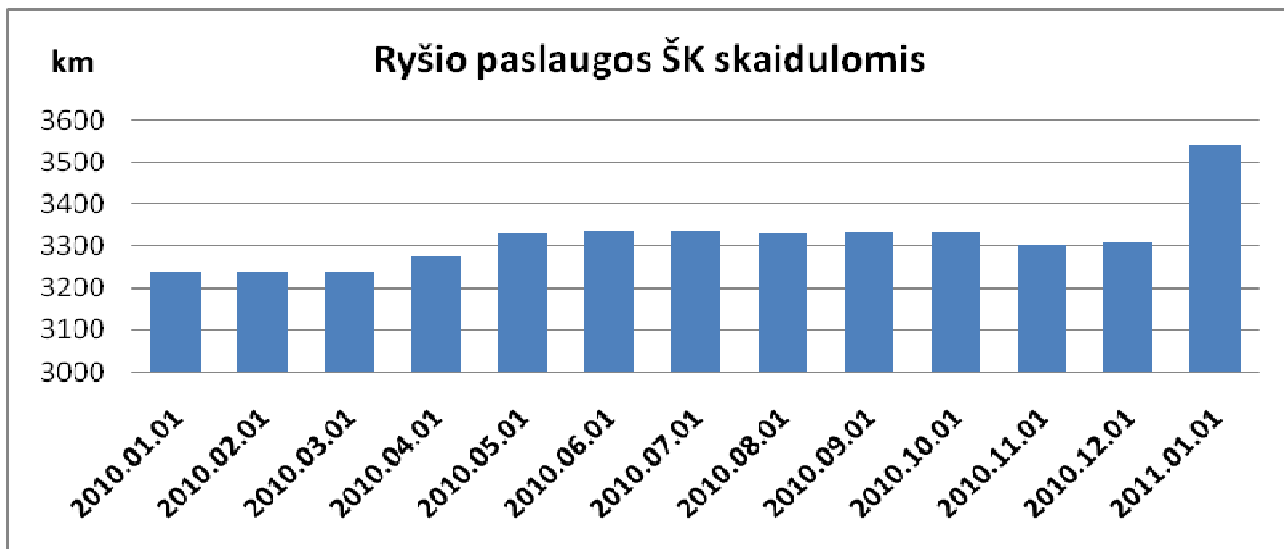

Per ataskaitinį laikotarpį buvo dirbama su 32 interneto paslaugų teikėjais (32 ryšio paslaugų teikimo sutartys). Taip pat ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ „Plaćiajuostis internetas“ buvo sudariusi 5 sutartis su savivaldybių administracijomis dėl duomenų srauto paslaugų mokymo įstaigų prijungimui prie plaćiajuosčio ryšio tinklų.

Įstaigos darbuotojai

Viešojoje įstaigoje „Plaćiajuostis internetas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 19 darbuotojų.

Įstaigos finansiniai rodikliai

Pajamos. Įstaigos 2010 m. strateginiame veiklos plane buvo numatytos šios pajamos: – 1 026,0 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ 7 tikslo įgyvendinimui finansuoti; – 600,0 tūkst. Lt RAIN2 projekto lėšų; ir – 5 050,0 tūkst. Lt buvo numatyta uždirbti pajamų už suteiktas paslaugas, panaudojant RAIN projekto metu sukurtą tinklą. – 50,0 tūkst. Lt buvo numatyta uždirbti kitos veiklos pajamų. Iš viso buvo numatyta – 6 726,0 tūkst. Lt pajamų.

Įstaiga per 2010 m. iš viso gavo 6 513,7 tūkst. Lt pajamų arba 96,8 % planuotųjų. Iš jų: – 1 026,0 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ 7 tikslo įgyvendinimui finansuoti (įvykdymas 100,0 %); – 536,9 tūkst. Lt gauta įgyvendinant projektą „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plėtra“ (įvykdymas 89,5 %). Šios pajamos gautos faktiškai patirtoms išlaidoms kompensuoti ir – 4 921,8 tūkst. Lt pajamų uždirbta už suteiktas paslaugas iš RAIN projekto metu sukurtą tinklą (įvykdymas 97,5 %).

Įstaiga per 2010 m. gavo 28,9 tūkst. Lt kitos veiklos pajamų (įvykdymas 57,8 %).

Per 2010 m.– 0,1 tūkst. Lt Įstaiga gavo finansinės veiklos pajamų.

Išlaidos. Įstaigos planuotos išlaidos per 2010 m.– 6 704,2 tūkst. Lt veiklos sąnaudų.

Įstaigos išlaidos per 2010 m. sudarė – 6 494,2 tūkst. Lt arba 96,9 % planuotųjų. Iš jų: – 1 026,0 tūkst. Lt, gautų iš valstybės biudžeto programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ 7 tikslo įgyvendinimui finansuoti, (įvykdymas 100,0 %); – 536,9 tūkst. Lt patirta išlaidų įgyvendinant projektą „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plėtra“ (išlaidos yra kompensuotos iš projekto.) (įvykdymas 89,5 %).

. Per 2010 m. Įstaiga padengė – 4 865,7 tūkst. Lt, RAIN tinklo eksploatacinių sąnaudų, (įvykdymas 97,2%). Kitos veiklos sąnaudos sudarė – 3,8 tūkst. Lt.

Per 2010 m. Įstaigos ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija sudarė – 61,8 tūkst. Lt.

Per 2010 m. įstaigos patirtos sąnaudos pagal finansavimo šaltinius

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Sąnaudos	2010 m. sąnaudos	iš jų pagal finansavimo šaltinius		
			Budžeto programos asignavimų	Įstaigos padengtos sąnaudos	RAIN Projekto lėšos
1.	PERSONALO IŠLAIKYMAS	1156,3		619,8	536,5

2.	BIURO IŠLAIDOS IR TARNYBINIS TRANSPORTAS	16,3		16,3	
3.	RYŠIAI	75,3		75,3	
4.	ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	73,6		73,6	
5.	RĖMIMAS IR RINKODARA	0,0		0,0	
6.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	27,8		27,8	
7.	DRAUDIMAS	1,0		1,0	
8.	MOKESČIAI	0,9		0,5	0,4
9.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	4,2		4,2	
10.	NUSIDĖVĖJIMAS	61,8		61,8	
11.	NETEKIMAI	0,0		0,0	
12.	TRANSPORTO SĄNAUDOS	177,8		177,8	
13.	KITOS SĄNAUDOS (RAIN SĄNAUDOS) *	4 899,2	1 026,0	3 873,2	
IŠ VISO IŠLAIDOS		6 494,2	1 026,0	3 688,8	536,9

Įstaiga ilgalaikių kreditorinių įsiskolinimų neturi.

Investicijos. Įstaigos 2010 m. strateginiame veiklos plane buvo numatytos investicijos 18,5 tūkst.

Per 2010 m. Įstaigos investicijos 24,7 tūkst. Lt. arba 133,4 % planuotųjų.

Įstaiga įsigijo: Brūkšninių kodų nustatymo techninė įrangą už – 3,3 tūkst. Lt; Stelažą biurui už – 5,5 tūkst. Lt; Komutacinę spintą – 6,1 tūkst. Lt; Stalus (2 vnt.) už – 2,2 tūkst. Lt ir Valdiklius MON (5 vnt.) už – 7,6 tūkst. Lt.

Direktorius

Romualdas Degutis
